

E001 - 73.



ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
4600008900-2020

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de instalación de lamina de control solar
para el piso 8 y 9 de la sede Central de COFIDE

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 31,499.99

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de Instalación: 24/01/2020 - 08/02/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí
No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí
No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe tecnico, certificado de la instalacion, hoja tecnica

8. PENALIDAD
Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Motivo <input type="checkbox"/>

9. OBSERVACIONES
Se coordinó el inicio de las actividades el 24/01/2020 por disponibilidad de tiempo del usuario
Instalación del: 24/01/2020 al 05/02/2020

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

JORGE PACHAS ARANA
 Gerente del Área Usuaria
 Fecha: 05/02/2020

Provisión enero 2020

Nº Pedido:	46-8900
Fecha Certificación:	31/01/2020
Plazo de Pago:	14/02/2020
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Retención PYME:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pago Anticipado:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.



Rengifo Daniel

De: RP Master Multiservicios <rpmastermultiservicios@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 05 de febrero de 2020 03:27 p.m.
Para: Rengifo Daniel
Asunto: Comparto 'INFORME ACTIVIDADES LAMINAS 3 M.docx' contigo
Datos adjuntos: INFORME ACTIVIDADES LAMINAS 3 M.docx

Estimado sr. Daniel,

Enviamos lo solicitado.

Gracias,

María Pachas C.

CERTIFICADO

Lima 17 de Enero del 20:

Cliente: RP MASTER MULTISERVICIOS E.I.R.L.
RUC: 20601903041
Obra: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

PROTECFILMS S.A.C Por el presente certificamos que el material suministrado es **PRESTIGE 70** marca **3M** de uso comercial / residencial.

Total: 2 ROLLOS (90 M2)
Referencia: FAC - 6977


Información Técnica:

- ✓ Alto nivel de transmisión de luz visible, otorga claridad, rechazo de energía solar.
- ✓ Mantiene el frío al reducir el exceso de calor en los meses más cálidos.
- ✓ Ayuda a reducir el brillo y la incomodidad en la vista.
- ✓ Prolonga la vida útil de muebles, telas y alfombras al bloquear rayos UV
- ✓ Ayuda a reducir los costos de aire acondicionado.

Este producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto protección solar.

Esta garantía no cubre las roturas o daños que se pudieran producir en la película ocasionada por terceros, limpieza inadecuada, o daños por elementos punzo cortantes.

Atentamente.

PROTECFILMS S.A.C.

LUCY PATINO CALLE
Gerente General





3M™ Lámina de Control Solar para uso Comercial/Residencial

Prestige 70

Información Técnica:

- Alto nivel de transmisión de luz visible, otorga claridad, rechazo de la energía solar competitivo
- Ayuda a reducir los costos de aire acondicionado
- No contiene metales, lo que significa que no hay interferencia de señales y no hay posibilidad de corrosión
- Mantiene el frío al reducir el exceso de calor en los meses más cálidos
- Ayuda a reducir el brillo y la incomodidad en la vista
- Ayuda a prolongar la vida útil de muebles, telas y alfombras al bloquear rayos UV

Desempeño del producto:

PR70								
	Single Pane		Tinted		Double Pane		Double tinted	
Film	1/4" Clear	PR70	1/4" tint	PR70	Dual 1/4" Clear	PR70	Dual 1/4" tint	PR70
Solar Heat Gain Coefficient	0.82	0.50	0.63	0.43	0.70	0.56	0.51	0.42
Visible Light Transmitted	89%	69%	53%	42%	79%	62%	47%	37%
Visible Light Reflected Interior	9%	9%	6%	7%	15%	13%	13%	12%
Visible Light Reflected Exterior	8%	9%	6%	6%	15%	15%	8%	8%
U Value	1.03	0.99	1.03	0.99	0.47	0.47	0.47	0.47
UV Block	38%	99.9%	NA	99.9%	NA	99.9%	NA	99.9%
Total Solar Energy Rejected	19%	50%	37%	57%	30%	44%	49%	59%
Glare Reduction	NA	22%	NA	22%	NA	22%	NA	22%
Heat Loss Reduction	NA	3%	NA	3%	NA	2%	NA	2%
Solar Heat Reduction	NA	38%	NA	31%	NA	21%	NA	18%



Lima 01 de febrero de 2020

Señores
COFIDE
Presente.-

Es grato dirigirme a usted para informarle, mediante el presente documento, el desarrollo del Servicio de realización de Orden de Servicio N° 4600008900-2019 "SERVICIO INSTALACIÓN LAMINAS CONTROL SOLAR ", por lo cual, expongo lo siguiente:

I. INFORME TÉCNICO


1. SERVICIO DE INSTALACIÓN LAMINAS CONTROL SOLAR PARA EL PISO 8 Y 9.

- Se limpiaron lunas existentes a instalar
- Se procedió a instalación de Láminas 3M de control solar
- Eliminación y retiro de residuos.





✚ **MATERIALES**


✚ PISO 8

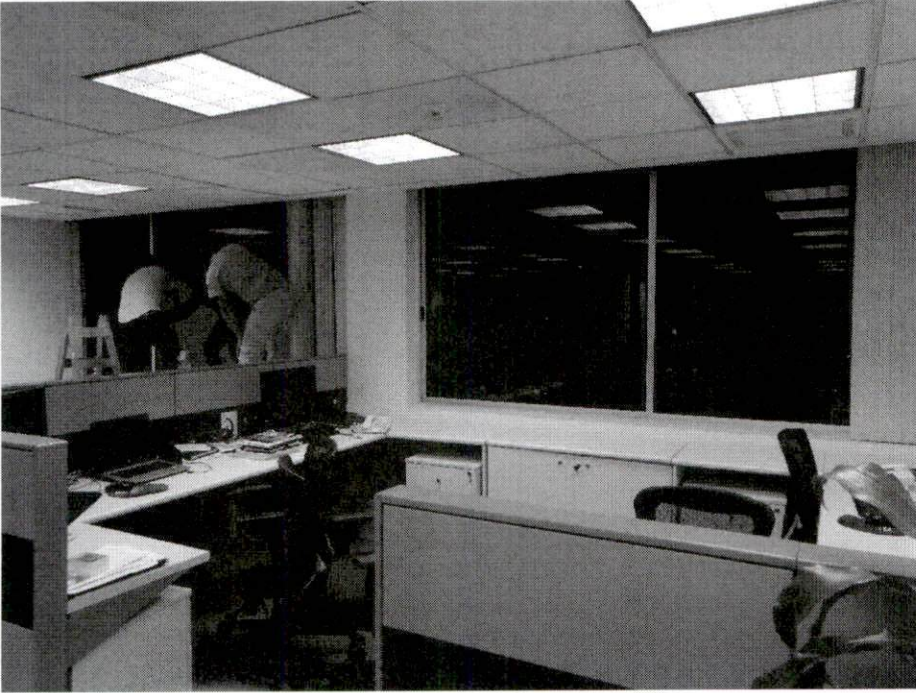




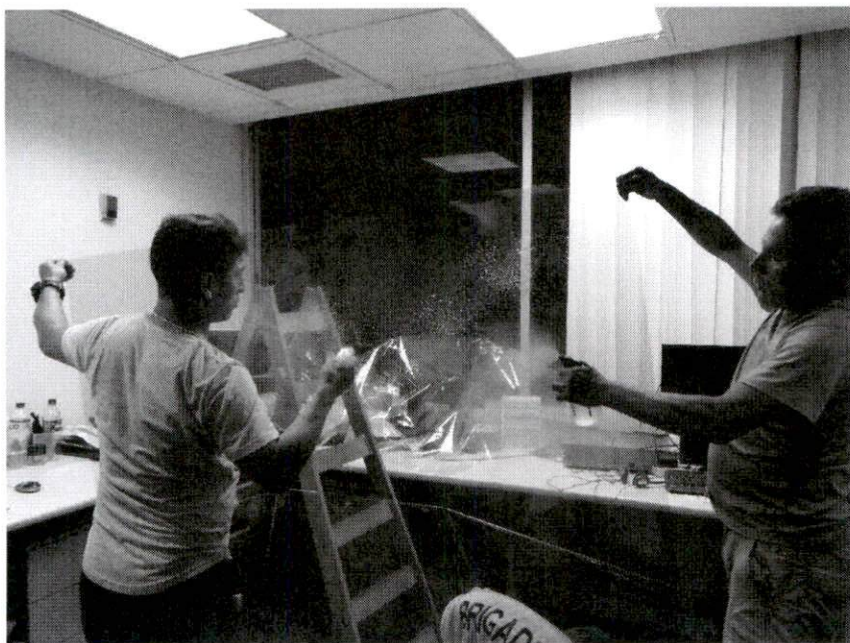


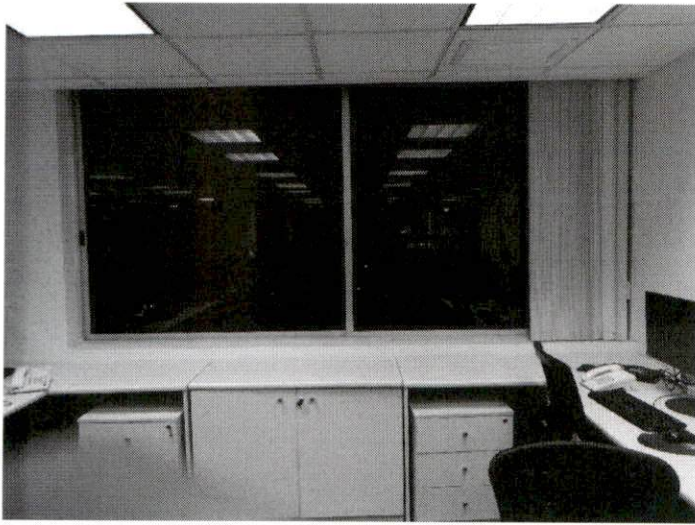

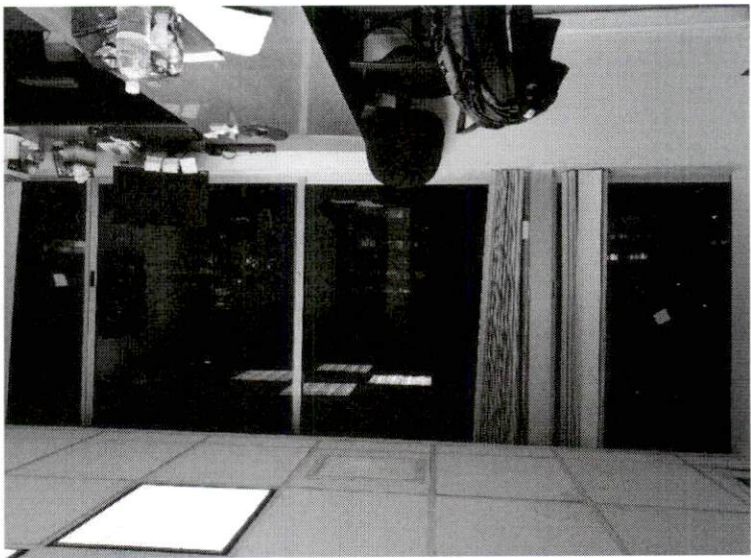

↑ PISO 9

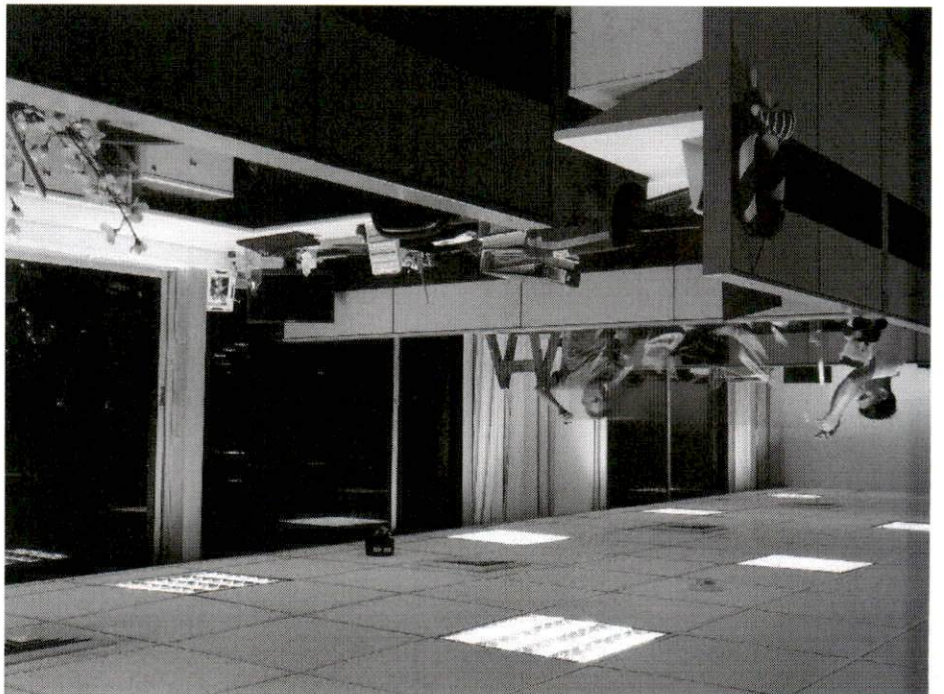

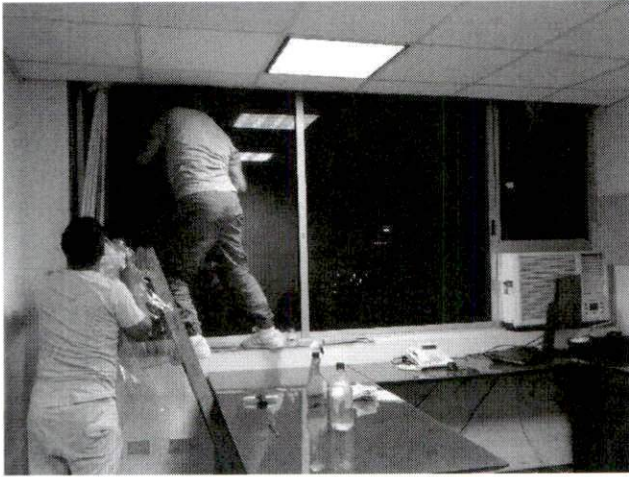





Por lo expuesto y esperando la atención a la presente, quedamos a su disposición.

Sin otro particular.

Atentamente,

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL


SANDRO RIVAS PLATA
Gerente General



CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

San Miguel, 01 de febrero de 2020

Señores
COFIDE
Presente.-

Es grato dirigirme a usted para informarle, mediante el presente documento, se realizó el desarrollo del Servicio de Orden de Servicio N° 4600008900-2019 "SERVICIO INSTALACIÓN LAMINAS CONTROL SOLAR ", por lo cual, expongo Lo siguiente:

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se realizó el servicio de instalación de lámina de control solar para los vidrios lado parque para el piso 8 y 9 de la Sede Principal de COFIDE.

Ubicación	Description	Área total
Piso 8	<u>Lamina de control solar</u> Protección o reducción UV - al 99.9% Rechazo a rayos o radiación infrarrojos (IR) - al 97%. Luz visible transmitida 69% Total, de Energía solar rechazada (reducción) - al 50% Reducción del resplandor - al 22% Factor o coeficiente solar - 0.50 Espesor – 0.038mm Material - Poliéster	45m2
	<u>Lamina de control solar</u> Protección o reducción UV - al 99.9%	

Piso 9	Rechazo a rayos o radiación infrarrojos (IR) - al 97%.	45m2
	Luz visible transmitida 69%	
	Total, de Energía solar rechazada (reducción) - al 50%	
	Reducción del resplandor - al 22%	
	Factor o coeficiente solar - 0.50	
	Espesor – 0.038mm	
	Material - Poliéster	

Nota:

- La tonalidad del color de la lámina fue definido por el departamento de Servicios Generales
- Se Presentó su hoja técnica del material en la cotización (MSDS)
- Los rangos definidos son lo mínimo permitido para la instalación del servicio
- Las medidas son de acuerdo a solicitud en TDR y verificado in situ. (El presente servicio incluye el laminado de todos los vidrios de las oficinas lado parque).

Por lo expuesto y esperando la atención a la presente, quedamos a su disposición.

Sin otro particular.

Atentamente,


 RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL
 SANDRO RIVAS PLATA
 Gerente General
